

DIAGRAMA PERT

Para el diagrama PERT he agrupado las tareas WBS en las siguientes macrotareas

A- Análisis funcional (Casos de Uso) : 6 días

Tarea WBS	Días
3.1.1	2
4.1.1	2
5.1.1	1
6.1.1	1
1.1.4	2 (Paralelo)

B- Gestión Fase 1 (WBS, Riesgos): 12 días

Tarea WBS	Días
1.1.1	3
1.1.2	6
1.1.3	3

C- Estimación y Plan SCM: 7 días

Tarea WBS	Días
1.2.1	2
1.2.2	5

D- Diseño de Base de Datos

Tarea WBS	Días
2.1.1	3
2.1.2	4

E- Diseño de Interfaces (Wireframes): 9 días

Tarea WBS	Días
3.2.1	2
4.2.1	3
5.2.1	2
6.2.1	2
3.2.2	1 (Paralelo)
4.2.2	2 (Paralelo)

F- Preparación del Entorno: 2 días

Tarea WBS	Días
Rubén	2 (Paralelo)
Rubén	2 (Paralelo)

G- Implementación Front/Back: 7 días


Tarea WBS	Días
3.3.1	2 (Paralelo)
3.3.2	2 (Paralelo)
4.3.1	2 (Paralelo)
4.3.2	2 (Paralelo)
5.3.1	1 (Paralelo)
5.3.2	1 (Paralelo)
6.3.1	1 (Paralelo)
6.3.2	1 (Paralelo)
6.3.3	1 (Paralelo)
6.3.4	1 (Paralelo)

H- Pruebas de integración: 2 días

Tarea WBS	Días
1.3.2	2

I- Post-Mortem y Cierre: 3 días

Tarea WBS	Días
1.3.3	2 (Paralelo)
1.3.4	3 (Paralelo)

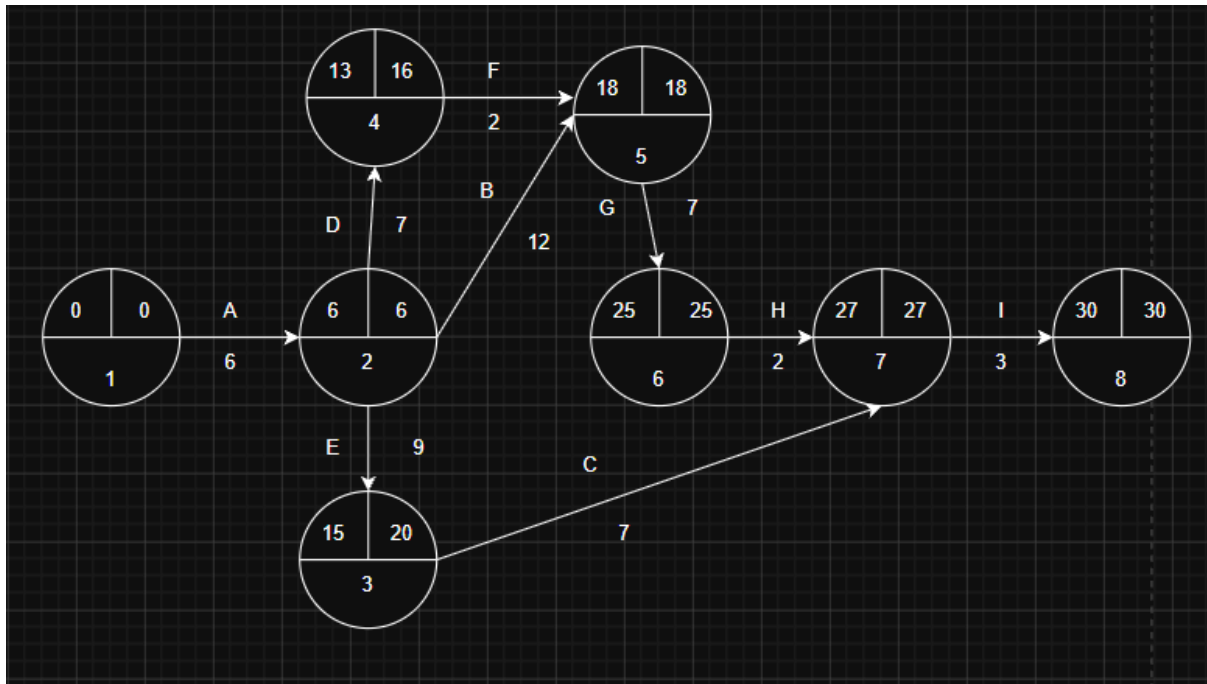

Donde $t.e = (ta + 4^{TM} + tb) / 6$

Tarea	Optimista (o)	Probable (m)	Pesimista (p)	T.E
A	4	6	8	6
B	9	12	15	12
C	5	7	9	7
D	5	7	9	7
E	6	9	12	9

F	1	2	3	2
G	5	7	9	7
H	1	2	3	2
I	2	3	4	3

Camino crítico: Nodo 1 → Nodo 2 → Nodo 5 → Nodo 6 → Nodo 7 → Nodo 8
Cualquier retraso en las tareas A,B,G,H o I retrasa la entrega final
